



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów postęp robót – stan na dzień 30.06.2019 r.

KONTRAKT K.1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE


Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 29.11.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 31.12.2020 r.

Postęp robót:

Wykonawca realizuje roboty związane z obiektami: reaktor osadu czynnego (ob. 4), garaż (ob. 34), stacja zagęszczania i odwadniania osadu (ob. 13), budynek wielofunkcyjny przy WKZz (ob. 27), osadnik wstępny (ob. 2) oraz instalacje.

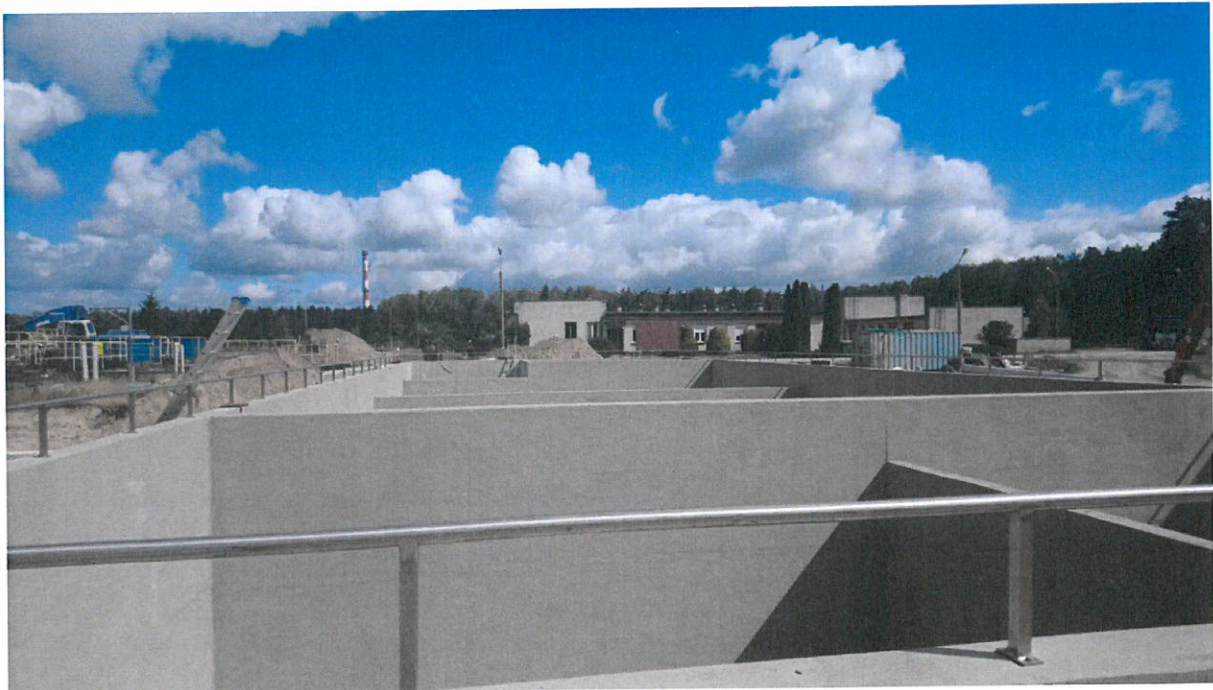







KONTRAKT K.2

ZADANIE 1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LEŚNA - KRESOWIAKÓW - JASTROWSKA

Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 14.09.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 30.09.2019 r.

Postęp robót:

Wykonawca zrealizował roboty w ul. Leśna – Kresowiaków – Jastrowska i przygotowuje dokumentację do odbioru końcowego.

ZADANIE 2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć tłoczną o długości 0,88 km (druga nitka sieci przesyłowej na oczyszczalnię).

KONTRAKT K.2

ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE

Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 28.12.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 30.06.2021 r.

Postęp robót:

Wykonawca realizuje prace projektowe. Trwa renowacja kanałów sanitarnych w ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Westerplatte, ul. Władysława Jagiełły, Al. Piasta.

