

## Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów postęp robót – stan na dzień 31.03.2020 r.

### **KONTRAKT K.1**

### **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE**

#### Terminy realizacyjne:


Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 29.11.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 31.12.2020 r.

#### Postęp robót:

Zaawansowanie robót na poziomie 50,26 %.



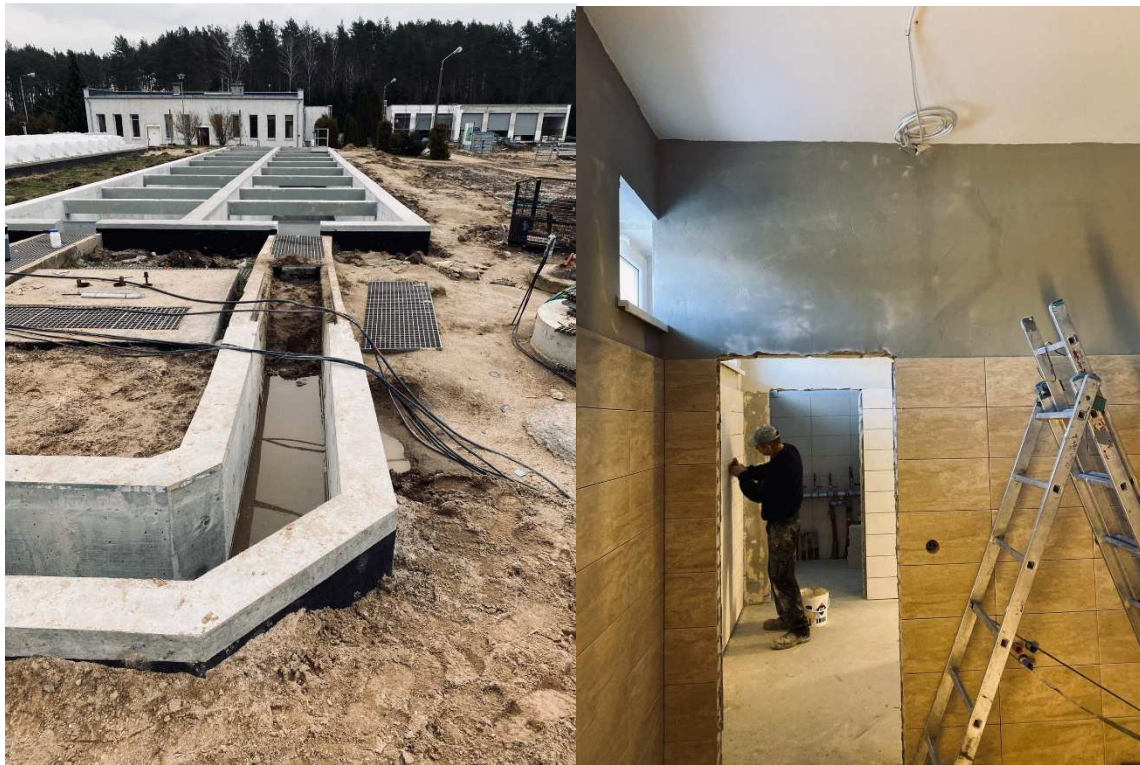

## **KONTRAKT K.2**

### **ZADANIE 1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LEŚNA - KRESOWIAKÓW - JASTROWSKA**

#### **Terminy realizacyjne:**

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 14.09.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 30.09.2019 r.

#### **Postęp robót:**

Wykonawca zrealizował roboty w ul. Leśna – Kresowiaków – Jastrowska. Wybudowa sieć wodociągową o długości 0,96 km i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,10 km. Dokonano odbioru końcowego.

### **ZADANIE 2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ**

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć tłoczną o długości 0,88 km (druga nitka sieci przesyłowej na oczyszczalnię).

## KONTRAKT K.2

### ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE

#### Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 28.12.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 30.06.2021 r.

#### Postęp robót:

Wykonawca realizuje prace projektowe w zakresie sieci (uzyskanie niezbędnych pozwoleń).

Zaawansowanie robót na poziomie 43,54 %.

